



新庁舎建設 現場レポート⑮

今回は、現場レポート第15弾として、新庁舎に併設する立体駐車場の工事の状況について紹介します。

☎ 新庁舎建設課 ☎ 214 - 6558 ・ FAX 264 - 1719


■立体駐車場の構造

工場で柱や梁などの部材を製作し、現場で組み立てるプレキャストコンクリートを採用しています。

■立体駐車場の工事の状況

新庁舎東側の限られたスペースでの作業となるため、建物を3つのエリア（配置図）に分け、はじめにエリア①を5階まで組み立てた後、エリア②、エリア③の順に組み立てます。昨年10月から部材の製作を開始し、今年2月に組み立て作業に着手しました。製作した部材は、大型クレーンを使用して、部材ごとに慎重につなぎ合わせて組み立てます。現在は、エリア①の組み立てが完了し、エリア②の作業を行っており、11月頃にすべてのエリアの組み立てが完了する予定です。

工事の進ちょく状況は、市ホームページにも掲載しています。あわせて、新庁舎建設事業にかかる寄附を募集しています。

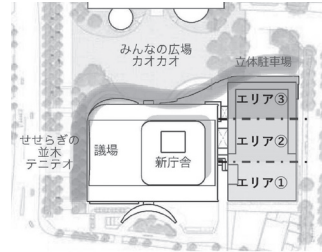

▲配置図

