



回 覧

黒野 校区

通学路安全対策 フォローアップ

第1回報告 R8.3

▶合意形成された対策工事は、下記のとおり順次実施する予定です。工事の実施状況は年度ごとにご報告させていただきます。



◀こちらよりアンケートにご協力をお願いします。

皆様から頂いたご意見は、今後の本市の施策の貴重な資料として活用させていただきます。

ワークショップで合意した通学路安全対策

黒野 校区

優先順位 1


地区	対策	地区	対策
A4	路面標示、民地の木の指導 警察パトロール、電柱移設、 見守り活動	C7	注意喚起看板、路面標示、 横断歩道塗り直し、 区画線塗り直し
済 B4	ガードパイプ	済 C11	歩道拡幅

優先順位 2

地区	対策	地区	対策
済 A6	ゾーン30標示改善、 警察パトロール、 回覧による周知	B7	路面標示、安全教育、 信号灯具増設
		C9	注意喚起看板、路面標示

優先順位 3

地区	対策	地区	対策
A2	カーブミラー	済 C3	路面標示
済 B1	横断歩道修繕、路面標示、 見守り活動		

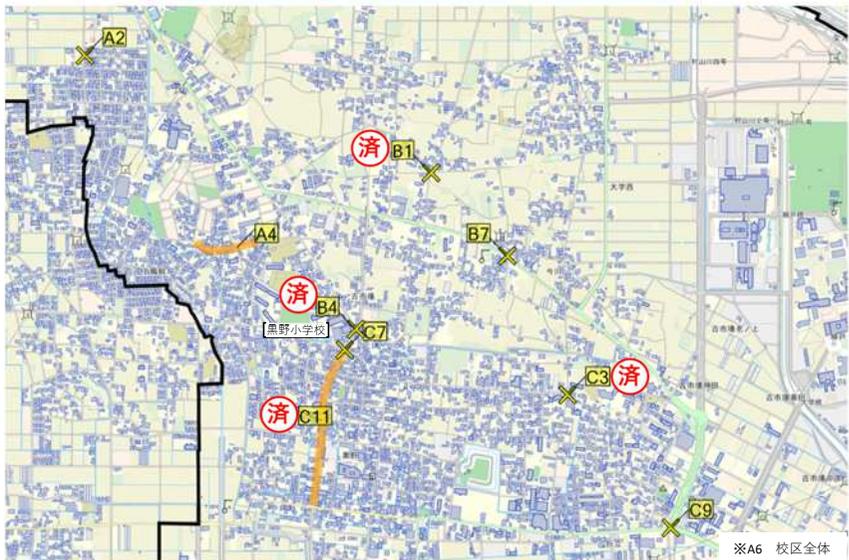

箇所	対策	進捗状況	箇所	対策	進捗状況
A2	カーブミラー	R8年度実施予定	B4	ガードパイプ	済
A4	路面標示	済	B7	安全教育	済
	民地の木の指導	済		信号灯具追加	不可(検討の結果取りやめ)(北署)
	電柱移設	R8年度実施予定	路面標示	R8年度実施予定	
	警察パトロール	済(随時)	C3	路面標示	済
A6	見守り活動	済	C7	注意喚起看板	済
	警察パトロール	済(随時)		路面標示	済
B1	ゾーン30について回覧による周知	済	C11	横断歩道塗りなおし	済
	横断歩道修繕	済		区画線修繕	R8年度実施予定
	路面標示	済	路肩拡幅(歩道幅員の拡大)	済	
	見守り活動	済	C9	注意喚起看板	不可(検討の結果取りやめ)(南)
				路面標示	検討中(県)

岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの取組を行っております。
黒野校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。令和7年度から順次工事等を実施しております。



通学路の安全対策実施状況

C 7
C 11

・横断歩道で車が止まらない。
・小学校から西町交差点まで歩道が狭い。

【備考】
・横断歩道塗り直し
(北署)
・区画線修繕はR8
年度実施予定



B 4

・北西角の歩車道の区別が分かりにくい。防護柵がない。車のスピードが速く、見通しも悪い。



【備考】
・交差点北東角、南東角について、現地確認の結果、バスの通行の妨げとなる可能性があるためガードパイプの設置困難。交差点北側に路面標示と注意喚起看板を追加設置。



A 4

・道路が狭く、カーブで見通しが悪い上に、交通量が多く、車がスピードを出している危険。信号機がない横断歩道があり、旗当番が朝しかいない。道路に木がはみ出ている。



【備考】
・電柱移設は関係機関と調整中。R8年度実施予定。

B 1

・横断歩道が消えかかっている。見通しが悪く、車のスピードが速い。



C 3

・車の交通量が多く、見通しが悪い。

