

1. 最近の動き

道路工事が完了し、一部供用開始しております（右写真）

上佐波西地区にて道路工事しておりましたが、工事が完了し、一部6月上旬から道路供用開始しております。今年度の道路工事の残り区間については、秋以降に着工予定ですので、工事着手時に改めてお知らせします。



道路の現況写真

2. 立地予定企業の工事状況

（株）光製作所（笠松町）

自動車部品の製造工場

令和7年1月 造成工事
令和8年1月 建築工事予定
令和9年2月 操業開始予定

施工：TSUCHIYA(株)
担当：尾関

《8.9月の工事内容》

・乗入れ工
※県道鶺羽島線を通行制限



（株）光製作所の工事の様子

（株）岡本（岐阜市）

セラミック部品の加工工場

令和7年5月 造成工事
〃 8月 建築工事予定
令和8年9月 操業開始予定

施工：内藤建設(株)
担当：加納

《8.9月の工事内容》

・貯留槽工
・排水工



（株）岡本の工事の様子

（株）ジーケーエス（岐阜市）

業務用食料品の卸売り

令和7年秋頃 造成工事予定

施工：内藤建設(株)
担当：古田

《8.9月の工事内容》

・なし



（株）ジーケーエスの工事予定地

※第2期区域では、上記企業含め、計10社程度の企業と立地に向けて協議中。

3. 道路、水道工事の状況（市施工）

上水道工事

老朽化した水道管を耐震性の高い管に取り替える工事を予定。
工事期間：令和7年7月～9月
施工者：(有)河野水道工業 担当：宮浦
発注者：市上水道事業課 担当：榎

《8.9月の工事内容》

・上水道管布設替工事


道路工事（秋頃から）

幅員を10mに拡幅するため、道路及び水路の工事を3工区に分けて施工予定。
工事延長：640m
工事期間：令和7年10月頃～8年5月頃
施工者：未定（契約手続中）
発注者：市道路建設課 担当：平光、森
※舗装工事、歩道工事を別途発注予定

本通信は、地域の皆様などに、工事の状況等をお知らせするため、定期的に発行させていただくものになります。

4. 区 域（通行止め情報等）※図はイメージです。

事業の内容は、市公式HPでもご覧になれます。

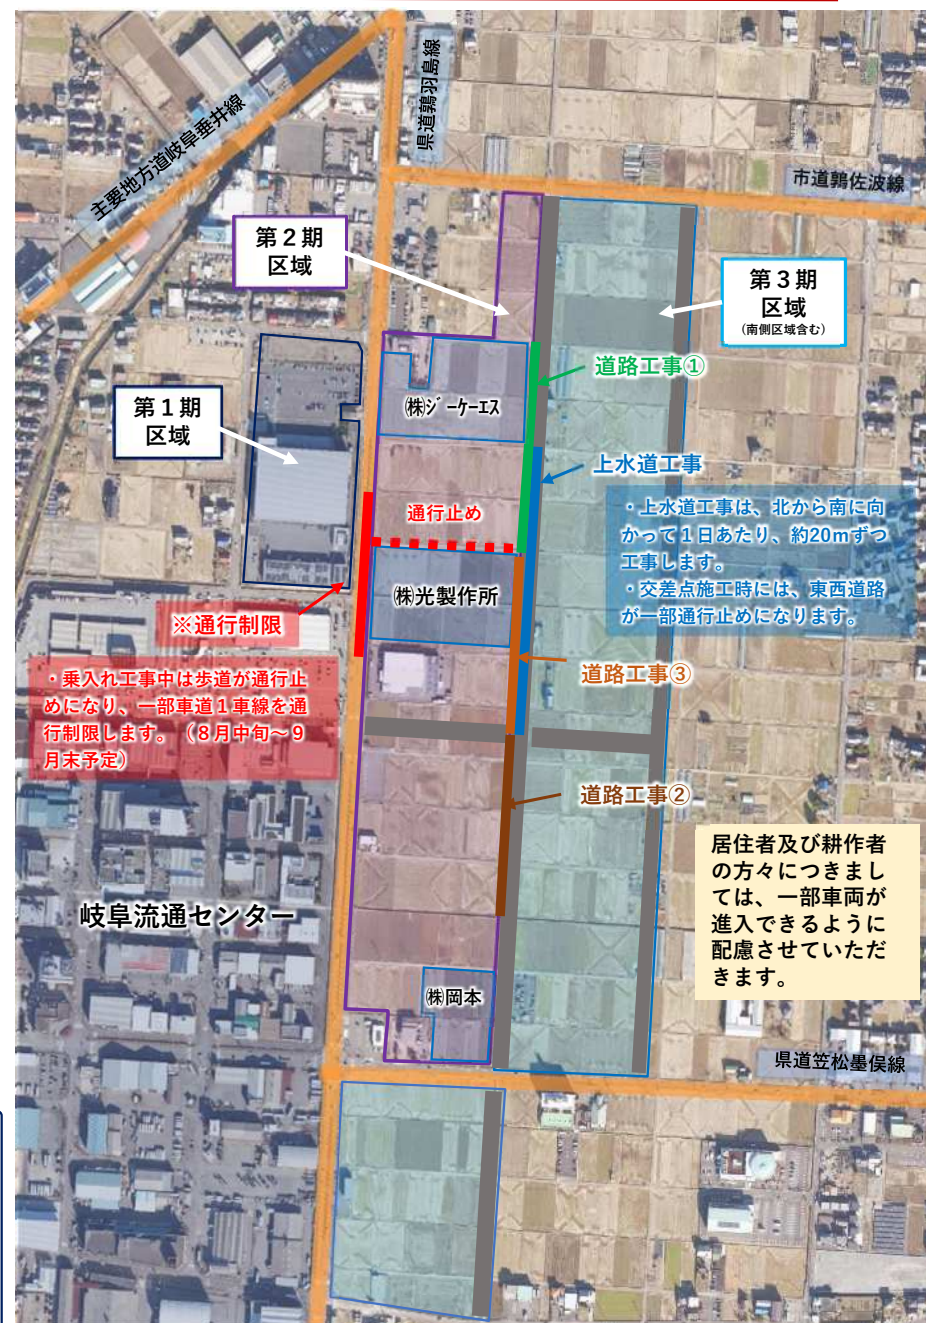

道路の整備予定箇所

2025年（令和7年）8月5日現在

担当：岐阜市経済部企業立地推進課 河合・出口
Tel：058-265-3989 Mail：richi-suishin@city.gifu.jp
